


FICHE "RHM"

Opérations de restauration hydromorphologique

Renseignements généraux

Intitulé de l'opération	Renaturation de la Dives sur la commune de Crocy		
Maître d'ouvrage	Fédération du Calvados pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique		
SIRET	780 748 752 00042		
Année de réalisation des travaux	2016	Bassin	DIVES
Cours d'eau	La Dives		
Enjeu/x de l'opération	Code Masse d'eau	FRHR281	
<input checked="" type="radio"/> Environnement / Biologie	Cadre réservé à la CATER CODE FICHE 2019010601_01		
<input type="radio"/> Hydraulique / Sécurité publique			
<input type="radio"/> Ressource en eau / Salubrité publique			

Localisation

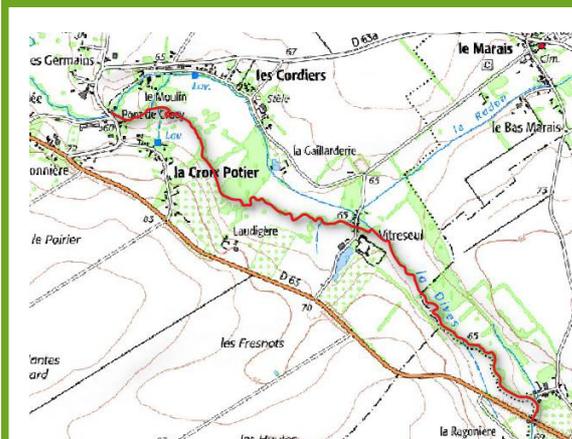

Source : IGN SCAN 25

Description des travaux réalisés

Suite à la mise en vente de la propriété du moulin de Crocy, la Fédération du Calvados pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique a racheté le droit d'eau, les ouvrages hydrauliques associés et le bief.

Le seuil de dérivation (ROE28563), le système de vannage associé (ROE59615) et le seuil de décharge (ROE59614) ont été effacés.

Le cours de la Dives a été modifié en aval de l'ancien seuil sur 95 mètres. Une recharge en matériaux caillouteux a été opérée au niveau du nouveau lit mais également dans l'ancienne retenue en vue de créer des radiers. Le bief a été comblé sur les 100 premiers mètres. Un pompage a été mis en place sur la Dives pour alimenter la partie du bief maintenue avec un débit de 7 l/s.

Le pont communal traversant la Dives a été remplacé par un pont tablier disposant d'une plus grande débitance et permettant d'améliorer les conditions d'écoulement en hautes eaux.

Une restauration de la ripisylve a été effectuée sur plus de 3 km.

Enfin, des clôtures et des abreuvoirs ont été mis en place sur la Dives, un affluent et le bief.

Commentaire sur l'évolution du site

Des levés topographiques ont été réalisés durant la phase études. Une nouvelle campagne sera faite pour évaluer les évolutions hydromorphologiques suite au rétablissement de la dynamique fluviale.

Vues des travaux réalisés

Avant



FCPPMA - 2013

Après



FCPPMA - 2016

FICHE "RHM"

Opérations de restauration hydromorphologique

Evolution des travaux réalisés :

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo
