


# FICHE "RCE"

## Opérations de restauration de la continuité écologique

### Renseignements généraux

<b>Intitulé de l'opération</b>	Suppression du vannage de décharge de l'ancienne pisciculture		
<b>Maître d'ouvrage</b>	Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques		
<b>SIRET</b>	200 013 266 000 16		
<b>Année de réalisation des travaux</b>	2011	Bassin	TOUQUES
<b>Cours d'eau</b>	La Courtonne		
<b>Enjeu/x de l'opération</b>	Code Masse d'eau HR276-I02-0410		
<input checked="" type="radio"/> Environnement / Biologie	Cadre réservé à la CATER CODE FICHE <b>ROE12366</b>		
<input checked="" type="radio"/> Hydraulique / Sécurité publique			
<input type="radio"/> Ressource en eau / Salubrité publique			

### Localisation

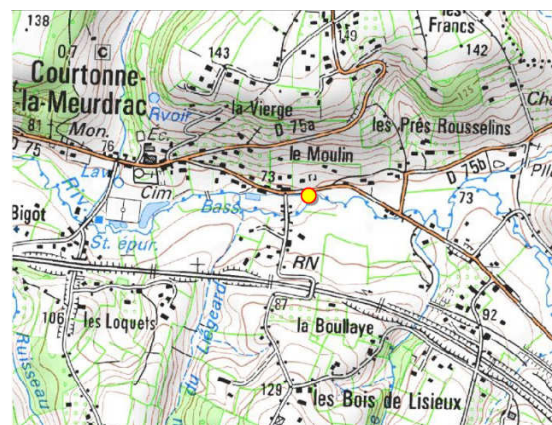

Source : IGN SCAN 25

### Description des travaux réalisés

La Courtonne était déviée le long d'une route et posait des problèmes de sécurité et de continuité écologique. Démantèlement du vannage, du canal d'amenée à l'ancienne pisciculture (linéaire de 141 m) et d'une passerelle (produits inertes réutilisés pour le remblai du bief, enlèvement des parties métalliques)

### Commentaire sur l'évolution du site



### Vues des travaux réalisés

Avant



F. MARIE - SMBVT

Après



Google ©

# FICHE "RCE"

## Opérations de restauration de la continuité écologique

Evolution des travaux réalisés :

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo
