


FICHE "RCE"

Opérations de restauration de la continuité écologique

Renseignements généraux

Intitulé de l'opération	Effacement du seuil de l'Usine Danone sur la Siette		
Maître d'ouvrage	Fédération du Calvados pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique		
SIRET	780 748 752 00034		
Année de réalisation des travaux	2017	Bassin	AURE
Cours d'eau	La Siette		
Enjeu/x de l'opération	Code Masse d'eau HR322-I4609000		
☒ Environnement / Biologie	Cadre réservé à la CATER CODE FICHE ROE44950_01		
☐ Hydraulique / Sécurité publique			
☐ Ressource en eau / Salubrité publique			

Localisation

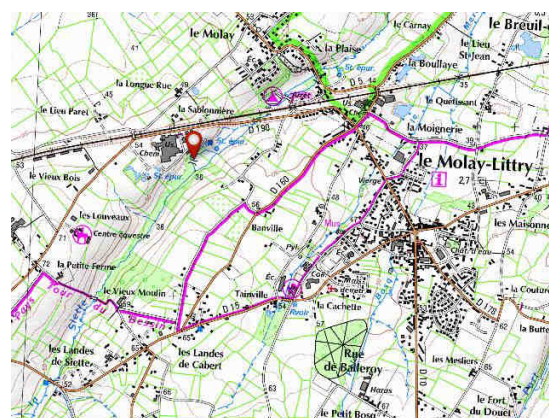

Source : IGN SCAN 25

Description des travaux réalisés

La fiche (et les coûts inscrits) concerne les deux seuils :

- Seuil Ouest usine Danone (ROE44950)
- Seuil Est usine Danone (ROE44949)

- Pêche de sauvetage ;
 - Gestion de la végétation et des embâcles ;
 - Effacement des culées et des fondations des seuils Est (ROE44949) et Ouest (ROE44950) ;
 - Maintien de la passerelle engins attenante au seuil Ouest ;
 - Retalutage des berges au droit des ouvrages ;
 - Aménagement d'un passage à gué en aval du seuil Est ;
 - Remise en état des terrains.

Travaux réalisés en novembre 2017.

Commentaire sur l'évolution du site

Suivi en cours :
 - Ajustement du cours d'eau lors des premières crues.

Vues des travaux réalisés

Avant



B. DUFOUR - FCPMA - 2017

Après



B. DUFOUR - FCPMA - 2017

FICHE "RCE"

Opérations de restauration de la continuité écologique

Evolution des travaux réalisés :

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

FICHE "RCE"

Opérations de restauration de la continuité écologique

Caractéristiques de l'obstacle

Code ROE	ROE44950
Nom	seuil Ouest usine Danone
Type	Seuil (1.2)
Propriétaire	Danone
Hauteur	1 m
Longueur	5 m
Hauteur de chute	0,9 m

Caractéristiques du cours d'eau

Nom	La Slette
Largeur	2,5 - 5m
Pente	Moyenne (0,3 - 0,6%)
Classement/s	Listes 1 et 2
Code masse d'eau	HR322-I4609000

Contraintes locales

Accessibilité	Mauvaise	Occupation du sol	Forêt - zones humides
----------------------	----------	--------------------------	-----------------------

Description des travaux

Travaux continuité

Effacement de l'ouvrage.

Mesure/s connexe/s

Débroussaillage + passage(s) à gué.

Durée des travaux 2 jours

Aspects réglementaires

Droit d'eau	Absent	Procédure Loi sur l'eau	Aucune
		Procédure Marché Public	Aucune

Détails techniques

Conception / Réalisation

Maîtrise d'oeuvre en régie.

Chute effacée	0,90 m
Restauration continuité	1 250 m
Restauration morphodynamique	200 m

Suivi/s réalisé/s biologie hydromorpho

- Suivi biologique : Indice Truite - Suivi hydromorphologique : photographies de l'évolution du cours d'eau dans l'ancienne retenue (érosion, sinuosité, faciès, substrats, ...)

Fiche RHM liée à l'opération 2018011701_01

Aspects financiers

Coût des travaux	6 003 € HT	Autre/s coût/s	0 € HT
Travaux continuité	4 334 € HT	Achat terrain	€ HT
Mesures connexes	1 669 € HT	Droit d'eau	€ HT
		Autre/s	€ HT

Plan de financement

80,0% Agence/s de l'Eau
20,0% Propriétaire/s privé/s
0,0% FDPPMA (maître d'ouvrage)

Coûts unitaires

6 670,00 € HT / m de chute effacée
4,80 € HT / m de rivière reconnectée
30,02 € HT / m de rivière libérée

Date : 17 novembre 2017



Fédération de pêche du Calvados
3 rue de Bruxelles
14 120 MONDEVILLE

FACTURE N° 171102

Effacement de seuils sur la Siette - Le Molay Littry (14)

DESCRIPTION	QUANTITE	PRIX Unitaire	TOTAL HT
DICT - Préparation de chantier - Installation de chantier - Remise en état de site - Repli de chantier.	1 ft	750,00	750,00
Démentèlement et effacement de deux seuils. Compris BRH. Talutage des berges et repositionnement des matériaux remobilisables. Export des bétons.	1 ft	4180,00	4 180,00
Travaux de recharge en granulats pied de butte et 0/150 dans le lit. Fourniture et mise en œuvre.	200 t	36,30	7 260,00
Fourniture et pose d'un passage à gué empierré.	1 u	1200,00	1 200,00
Travaux d'entretien léger de végétation.	205 ml	2,00	410,00
TOTAL HT			13 800,00 €
TVA 20%			2 760,00 €
Total TTC			16 560,00 €

"Facture certifiée sincère et véritable pour la somme de
Seize mille cinq cent soixante euros."

Coordonnées bancaires

Crédit Mutuel de Carentan	Code banque 15489
N° Compte Bancaire : 00098075040	
N° Code guichet : 04701	Clé RIB : 80

ESPACE Basse Normandie
Le Directeur,
LES BRUYÈRES
14240 CAHAGNES
Tél : 02 31 77 37 96 / Fax : 02 31 77 84 51
N° Siret : 438 063 216 000 32 - APE : 9104Z
Laurent BESANCON

■ Restaurer ■ Protéger ■ Prévenir ■ Valoriser

Entretien, Sauvegarde des Patrimoines et Aménagement des Cours d'Eau de Basse-Normandie

Siège social : Les Bruyères - 14240 CAHAGNES - Tél. 02 31 77 37 96 Fax 02 31 77 84 51

espace@espace-basse-normandie.fr - www.espace-basse-normandie.fr

Association loi 1901 - n° Siret : 43806321600032 - APE : 9104Z - n° de TVA intracommunautaire : FR01438063216
