


# FICHE "RHM"

## Opérations de restauration hydromorphologique

### Renseignements généraux

<b>Intitulé de l'opération</b>	Remise en fond de vallée de la Maure à Bois Robert (La Ferté-Macé)		
<b>Maître d'ouvrage</b>	Parc Naturel Régional Normandie-Maine		
<b>SIRET</b>	256 102 229 00018		
<b>Année de réalisation des travaux</b>	2017	Bassin	MAYENNE
<b>Cours d'eau</b>	La Maure		
<b>Enjeu/x de l'opération</b>	Code Masse d'eau	GR0507	
<input checked="" type="radio"/> Environnement / Biologie	Cadre réservé à la CATER CODE FICHE <b>2019013102_01</b>		
<input type="radio"/> Hydraulique / Sécurité publique			
<input type="radio"/> Ressource en eau / Salubrité publique			

### Localisation

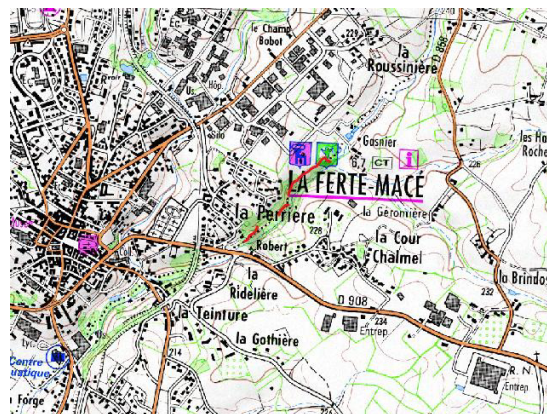

### Description des travaux réalisés

Une portion de 650 mètres environ de la Maure avait été mise en bief afin d'alimenter un moulin. Le moulin étant ruiné, une restauration du lit en fond de vallée a été opérée car les écoulements et les habitats étaient fortement influencés par cette mise en bief (2 chutes difficilement franchissables et écoulements majoritairement lenticques).

La remise en fond de vallée n'a pu être opérée sur l'ensemble du linéaire pour des raisons d'accessibilité (humidité des terrains). Par ailleurs, pour la même raison, elle ne s'est accompagnée d'une recharge en granulats que sur une portion limitée (115 mètres des 450 mètres concernés).

### Commentaire sur l'évolution du site

L'évolution du site est positive avec une recharge en matériaux sablo-graveleux voire cailloux qui s'opère déjà sur les portions remises en fond de vallée.

Des phénomènes d'érosions régressives et progressives d'ampleur limitée sont observés qui traduisent un ajustement du lit à son profil en long naturel. Ces phénomènes étaient attendus et sont souhaitables pour restaurer le matelas alluvial du lit recréé et favoriser la diversité des écoulements.

### Vues des travaux réalisés

Avant



Après



# FICHE "RHM"

## Opérations de restauration hydromorphologique

Evolution des travaux réalisés :

Année N+



Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo
